
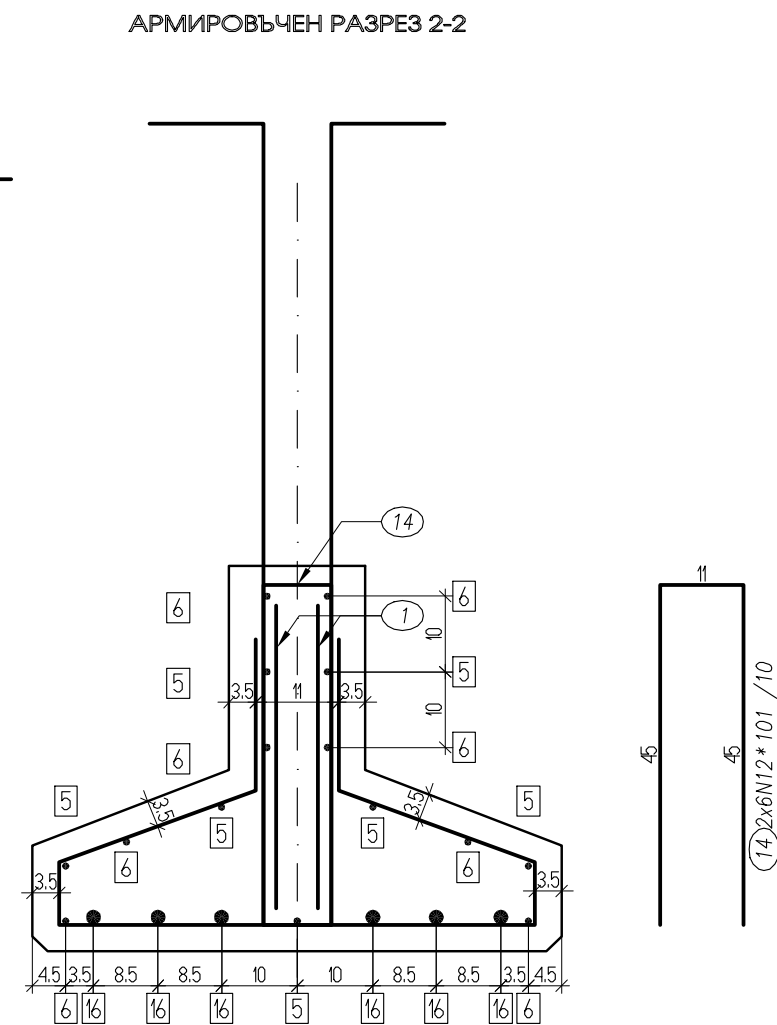
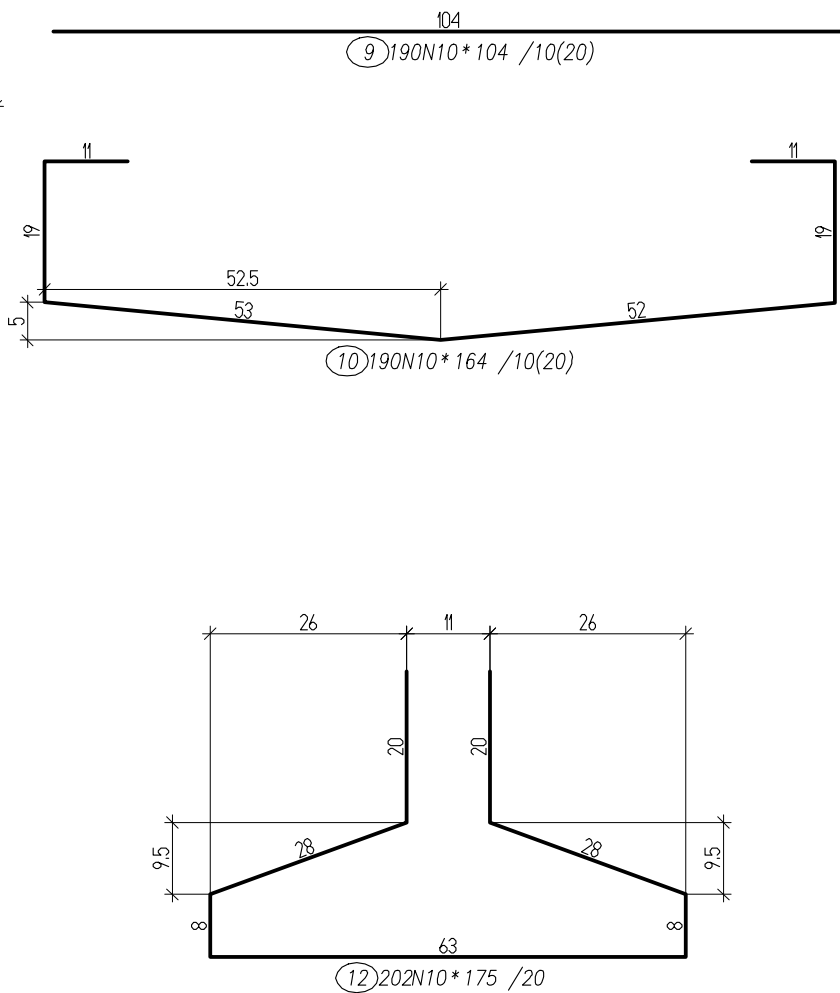
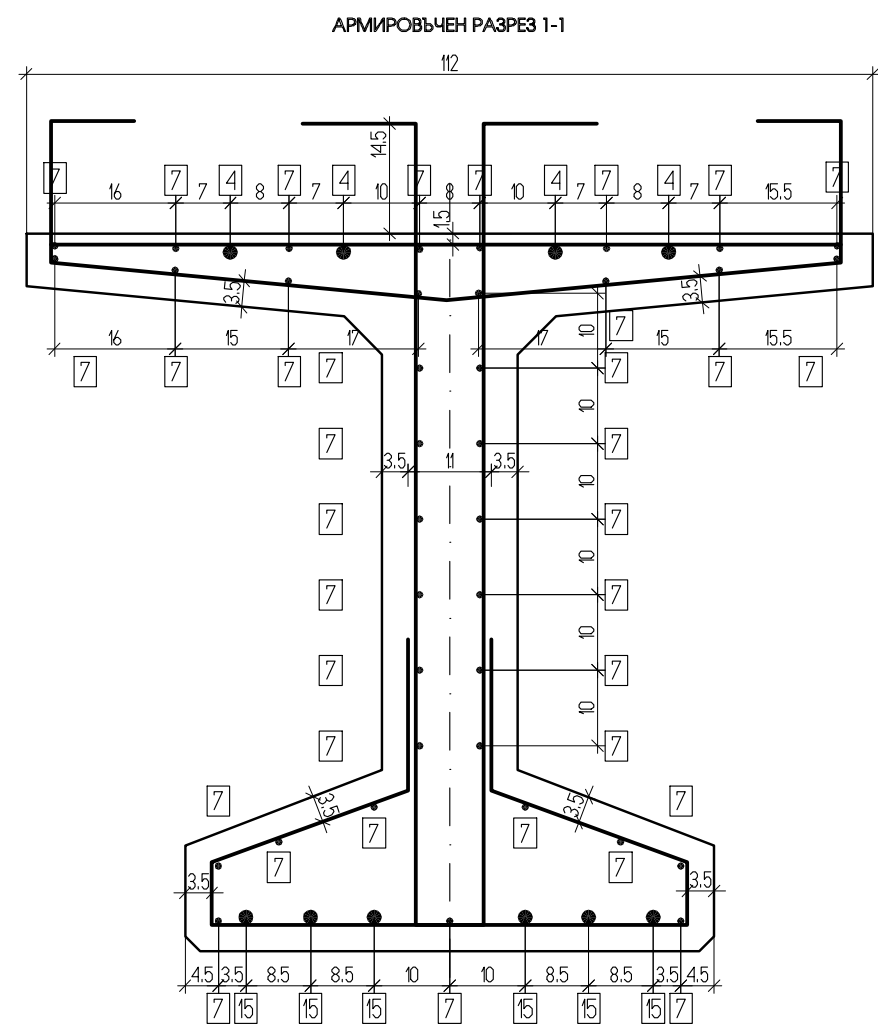
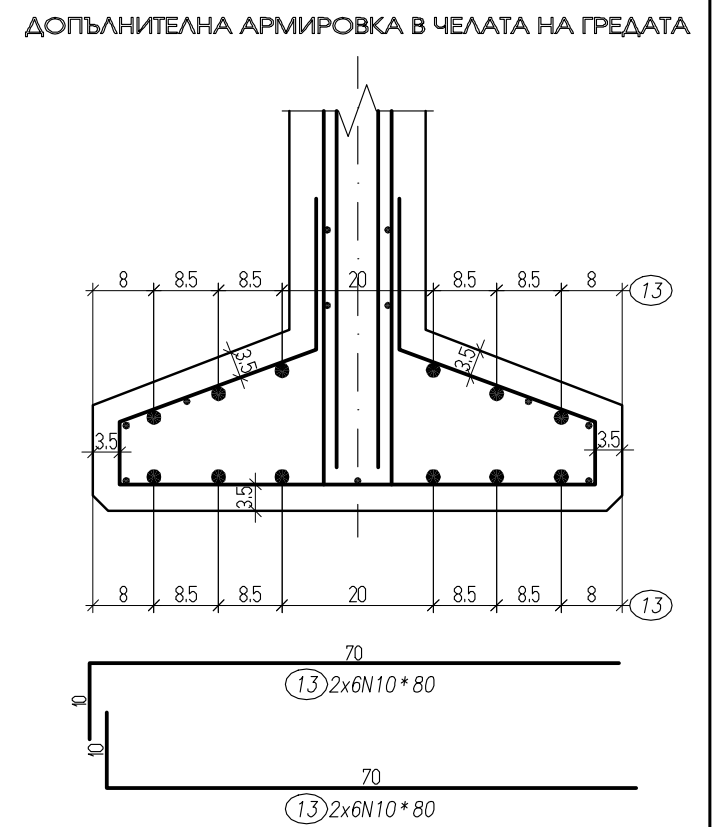
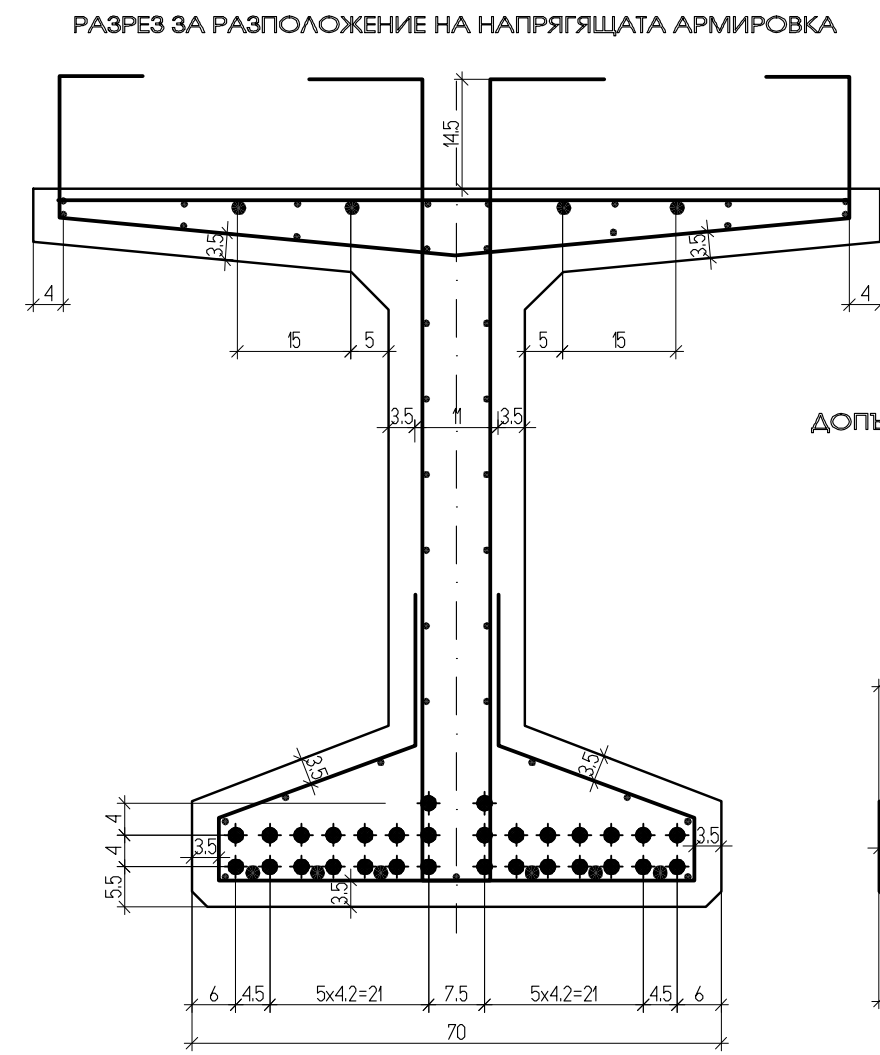
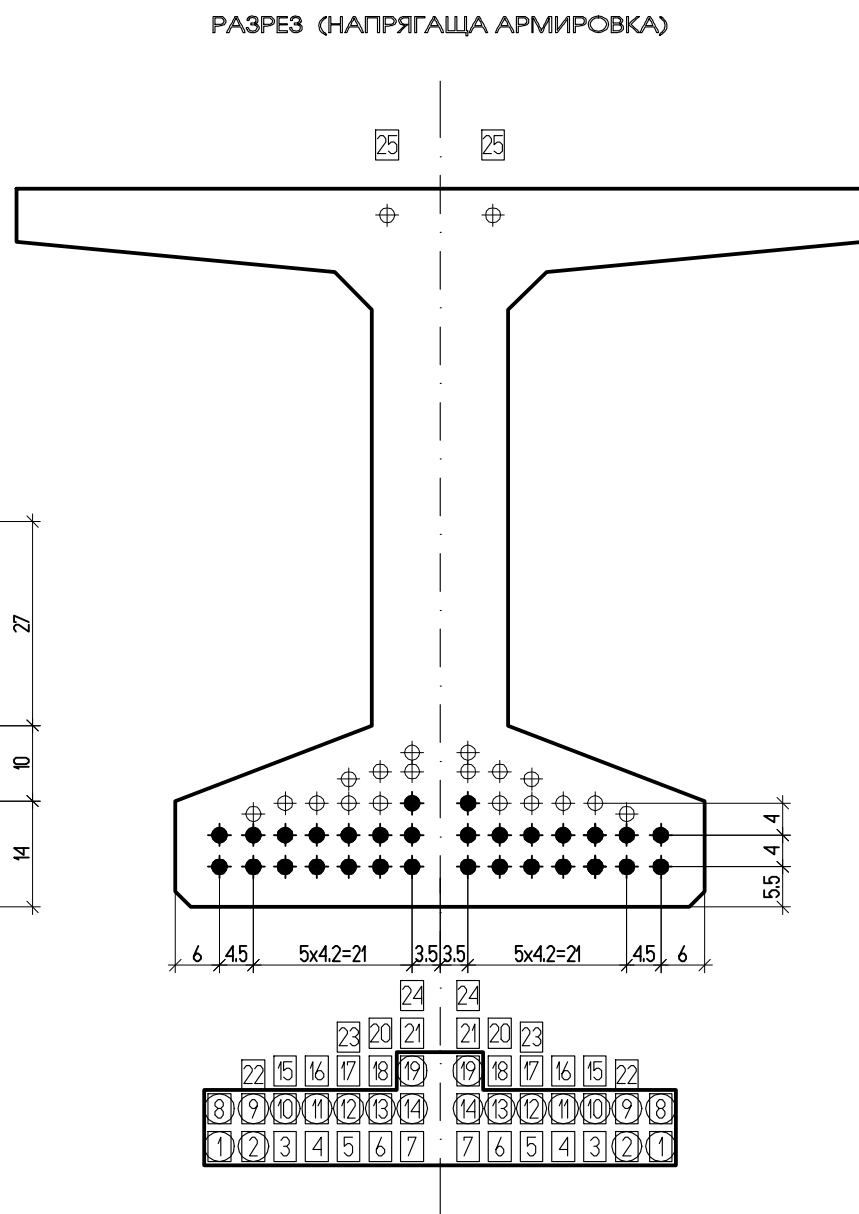
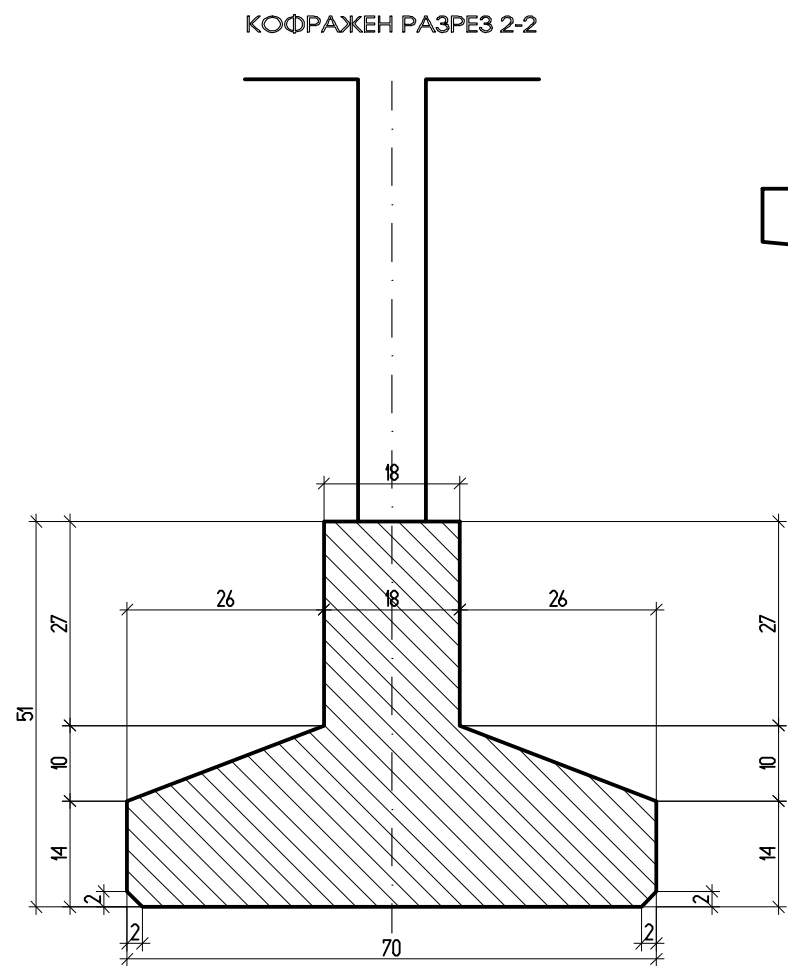


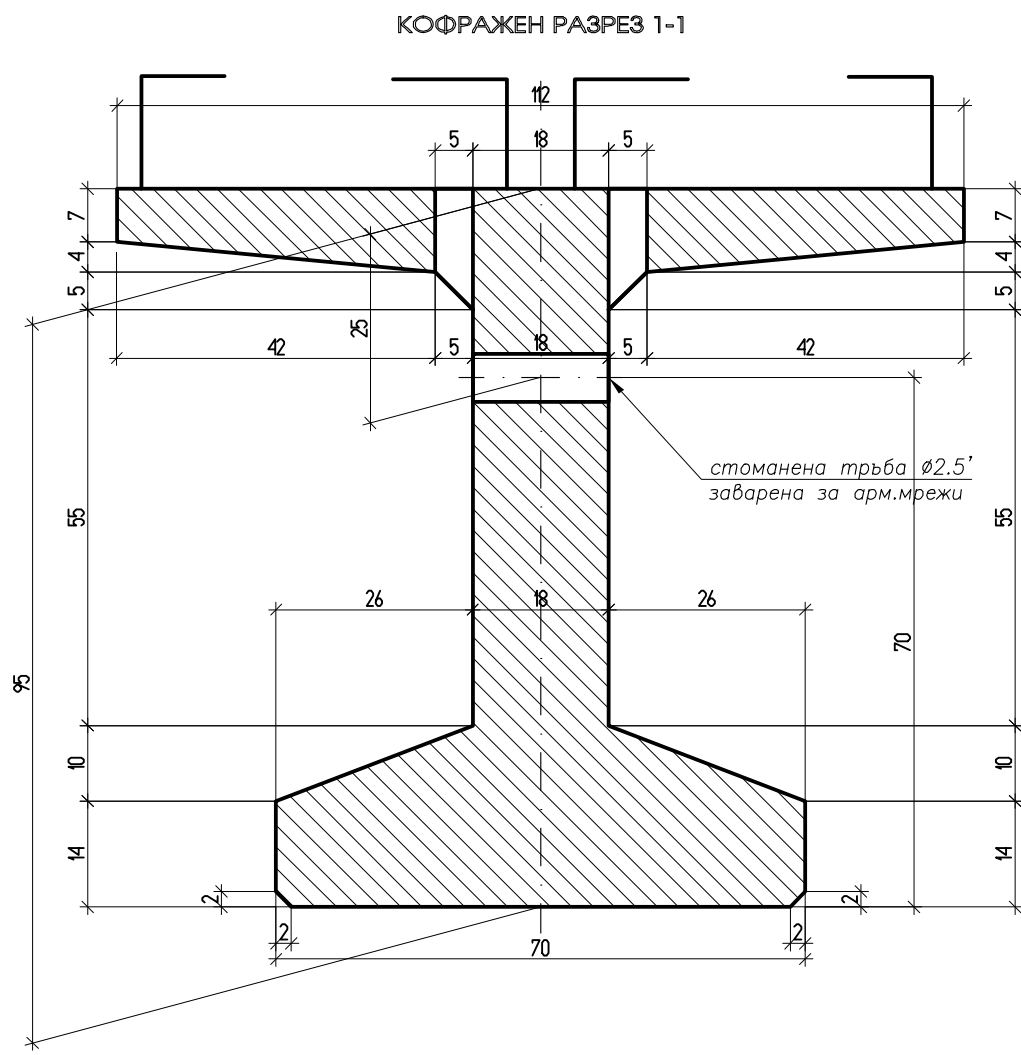

- ЗАБЕЛЕЖКИ:
- БЕТОН : КЛАС C40/50 КОЛИЧЕСТВО: 9,7m³
 - МОНТАЖНО ТЕГЛО 24,3 t
 - НАПРЯГАЩА АРМИРОВКА : EN 10138-3-Y1860S7-12,5-A С НИСКА РЕЛАКСАЦИЯ СЪГЛАСНО EN 10138 КЛАС А ПО КОРОЗИЯ СЪГЛАСНО EN 10138 f_{yk} = min1860MPa f_{yk} = min1670MPa ВЪЖЕТА СТОМАНЕНИ АРМИРОВЪЧНИ 1 x 7 С УСЛОВЕН ДИАМЕТЪР 12,5mm КОНТРОЛИРУЕМА НАПРЯГАЩА СИЛА ЗА ЕДНО ВЪЖЕ - 12,1 ТОНА БРОЙ НА НАПРЕГНАТИТЕ ВЪЖЕТА: 30 КОЛИЧЕСТВО: 0,591 ТОНА ПРИЛАГАНЕТО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АРМИРОВКА, РАЗЛИЧНА ОТ СПЕЦИФИЦИРАНАТА ТУК, СТАВА САМО СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ С ПРОЕКТАНТА
 - ОБИКНОВЕНА АРМИРОВКА : СТОМАНА B500B ОЗНАЧЕНА С - N; СВЕТЛО БЕТОНОВО ПОКРИТИЕ НА ОБИКНОВЕНАТА АРМИРОВКА - 20MM
 - СТОМАНА ЗА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ : S235;
 - ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ГРЕДИТЕ ОТ СТЕНДА СТАВА ПРИ minfck=32MPa И ВЪЗРАСТ МИН ЗДНИ, КАТО ВЪЖЕТАТА СЕ ОТПУСКАТ ПЛАВНО ПРЕДИ ДА СЕ ИЗРЕЖАТ. ГРЕДИТЕ ДА СЕ СКЛАДИРАТ ОПРЕНИ НА 40CM ОТ ЧЕЛО ГРЕДА И ДА СЕ ТРАНСПОРТИРАТ С МАКСИМАЛНА КОНЗОЛА 150CM
 - ВЪЗМОЖЕН Е И ДРУГ НАЧИН ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ, БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ КУКИ.

	Ø40	ОБЩО
L [m]	6	TOTAL
g [kg]	59	59

	N10	N12	N16	N20	ОБЩО
L [m]	2084	347	16	312	TOTAL
g [kg]	1284	308	25	769	2386

407/14	ОБЕКТ:	АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА МОСТ НА Р."ЧЕПИНСКА" от о.т.22 до о.т.94 с ДРАГИНОВО, Община Велинград Област ПАЗАРДЖИК						Машаб: 1:10	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Велинград кметство с. Драгиново	Подпис и печат на възложителя	ИЗПЪЛНИТЕЛ:		УПРАВИТЕЛ: проф. д-р инж. К.ТОПУРОВ	ЧАСТ: ФАЗА:		Проектант: инж. П. НИКОЛОВ	Дата: 07.2014
						СЪДЪРЖАНИЕ:		Проектант: инж. А. МАРИНОВ	Чертеж No TBR012A
								ТК: инж. К. ТОПУРОВ	
